

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132

Τηλ.: 2105745826

www.asda.gr - info@asda.gr

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 6/6/2024

Αρ. Πρωτ.: 2295

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **12^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **37/2024** της Ε.Ε.

Στις 03/06/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **12^η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου - Σταύρου Τσίρμπα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 29/05/2024

Σύνολο μελών : 3
Παρόντες : 3 Γεώργιος - Σταύρος Τσίρμπα, Πρόεδρος, Νικόλαος Χουρσαλάς - Αντιπρόεδρος,
Δημήτριος Κουκουβίνος - μέλος
Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2^ο** θέμα της Η.Δ. περί: «**Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου "Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου"**» και λέει τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας και συγκεκριμένα το τμήμα Μελετών και Έργων, εισηγείται το ανωτέρω θέμα και αναφέρει τα εξής:

Το έργο "Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", εκτελείται από τον ΑΣΔΑ στα πλαίσια της από 15.05.2017 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Πετρούπολης και του ΑΣΔΑ, όπως ισχύει σήμερα, μετά τις από 19/03/2021, 04/01/2022 και 11/08/2023 Τροποποιήσεις της, με ανάδοχο την τεχνική εταιρεία "ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.", δυνάμει του υπ' αριθμ. πρωτ. 4306/26.08.2019 Εργολαβικού Συμφωνητικού, ποσού 949.194,01€, προ ΦΠΑ 24% (ΑΔΑ:ΩΛΚΜΟΡΕΓ-ΠΥΗ,ΚΗΜΔΗΣ:19ΣΥΜΝ005479854), καθώς και της υπ' αριθμ. 1612/04.04.2022 1ης Συμπληρωματικής Εργολαβικής Σύμβασης, ποσού 454.931,45€, προ ΦΠΑ 24% (ΑΔΑ: 980ΖΟΡΕΓ-ΡΤΕ,ΚΗΜΔΗΣ:22ΣΥΜΝ010330276).

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΑΣΔΑ με την υπ' αριθ. 34/2024 Απόφασή της (ΑΔΑ:Ψ7Ι4ΟΡΕΓ-ΣΥΦ), χορήγησε παράταση με αναθεώρηση τριάντα μία ημερών (31) ημερών, στην προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών της αρχικής και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, δηλαδή μέχρι τις 31.05.2024, κατόπιν του με αριθ. πρωτ. 1680/23.04.2024 σχετικού αιτήματος του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος με το υπ' αριθ. πρωτ. 2052/27.05.2024 αίτημά του, ζήτησε εκ νέου παράταση του χρόνου περαίωσης του ανωτέρου έργου κατά δύο μήνες, δηλ. έως 31.07.2024, λόγω του απαιτούμενου πρόσθετου χρόνου επίλυσης τεχνικών θεμάτων, σχετικά με την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του έργου και της κατασκευής της κλίμακας προς την οδό Διγενή Ακρίτα.

Ο Ανάδοχος με το υπ' αριθ. πρωτ. 2045/24.05.2024 έγγραφό του υπέβαλε παρατηρήσεις σχετικά με τη μελέτη αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων του περιβάλλοντος χώρου του έργου, ισχυριζόμενος ότι το δίκτυο απορροής των ομβρίων έχει υποδιαστασιολογηθεί σε ορισμένη περιοχή του έργου και σχετικά με την κατασκευής της κλίμακας προς την οδό Διγενή Ακρίτα, που αφορούν στην παροχή διευκρινήσεων από τους μελετητές για τον τρόπο κατασκευής της κλίμακας, με την παροχή αρχιτεκτονικού και στατικού σχεδίου, που δεν περιλαμβάνεται

στη μελέτη του έργου.

Η Δ/νση Τ.Υ. του ΑΣΔΑ (Διευθύνουσα Υπηρεσία) με το υπ' αριθ. 2048/24.05.2024 έγγραφό της, διαβίβασε το αίτημα του αναδόχου στους συμβούλους - μελετητές του έργου "Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ" και "ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ" και ζήτησε τις απόψεις τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δ/νουσα Υπηρεσία εκτιμά ότι προκειμένου να επιλυθούν τα τεχνικά θέματα, που έθεσε ο Ανάδοχος, σχετικά με τη διαστασιολόγηση του δικτύου αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων σε ορισμένη περιοχή του περιβάλλοντος χώρου του έργου και την κατασκευή της κλίμακας προς την οδό Διγενή Ακρίτα και να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου, δύναται να χορηγηθεί παράταση εξήντα μία (61) ημερών στην τρέχουσα προθεσμία περαίωσης, δηλαδή μέχρι 31.07.2024, σύμφωνα και με το αίτημα του Αναδόχου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να προχωρήσουμε στην λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση εξήντα μία (61) ημερών, της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της αρχικής και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου "Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", δηλαδή μέχρι 31.07.2024, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/16.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010), όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α, 08/08/2016), όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α, 19/07/2018), όπως ισχύουν
5. Την υπ' αριθ.10/2023 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2024" (ΑΔΑ:610ΤΟΡΕΓ-ΣΤ7) που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ.2030/05.01.2024 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (α.π. ΑΣΔΑ 131/08.01.2024)
6. Την υπ' αριθ.4306/26.08.2019 (α.π. ΑΣΔΑ) Σύμβαση έργου (ΑΔΑ:ΩΛΚΜΟΡΕΓ-ΠΥΗ, ΚΗΜΔΗΣ:22ΣΥΜΝ010330077)
7. Την υπ' αριθ.2067/28.05.2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ
8. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

• Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση εξήντα μία (61) ημερών, της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της αρχικής και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου "Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", δηλαδή μέχρι 31.07.2024, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/16.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **37/2024** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Γεώργιος - Σταύρος Τσίρμπας

Νικόλαος Χουρσαλάς

Δημήτριος Κουκουβίνος

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 03/06/2024

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος - Σταύρος Τσίρμπας
Δήμαρχος Αγ.Αναργύρων - Καματερού

::Δ.Τ.Υ. ::Πρόεδρο ΑΣΔΑ
κ. Γεώργιο-Σταύρο Τσίμπα

Συνημμένο Αρχείο	
34322-34283-ΑΙΘΗΜΑ-PARATASHS.pdf	Επισκόπηση
34322-34283-GP-02048-DIAVIVASH-PARATHRHSEWN-EPI-APOX-OMVRIWN-STON-BASILOP.pdf	Επισκόπηση
34322-34283-PARATHRHSEIS.pdf	Επισκόπηση
34322-34283-ΥΠΟΒΟΛΗ-PARATHRHSEWN-ΟΜΒΡΙΑ.pdf	Επισκόπηση



ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Αχιλλέως 4 - Χαλάνδρι - Τ.Κ.: 15231
Τηλ.Κέντ.: 210.6745906 FAX: 210.6725410

 <https://ktsa.gr>
 info@ktsa.gr

Ανάδοχος του έργου:
«Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης
Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης & Ανάπλαση
Περιβάλλοντος Χώρου»

Χαλάνδρι, 24 / 05 /2024

ΠΡΟΣ: Α.Σ.Δ.Α.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση του χρόνου περαίωσης του ανωτέρω έργου

Παρακαλούμε όπως μας εγκρίνετε παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλ. έως 31/07/2024, λόγω του απαιτούμενου πρόσθετου χρόνου επίλυσης των τεχνικών θεμάτων σχετικά με την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του έργου και της κατασκευής της κλίμακας προς την οδό Διγενή Ακρίτα όπως αναφέρονται στο έγγραφό μας με αρ.πρωτ. 2045-24/05/2024.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Με Τιμή,
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

Γεώργιος Χ. Καπερώνης
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 4 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ.15231 - Τ.:210-6745906
ΑΦΜ: 094319985 - ΔΟΥ: ΦΑΕΑΘΗΝΩΝ
e-mail: info@stathiskokkinis.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ**

Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132

Τηλ.: 2105745826

www.asda.gr - info@asda.gr

: : Γενική Διεύθυνση : Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών

Πληροφορίες: Χωματά Σοφία (homata@asda.gr)

Περιστέρι: 24/5/2024

Αρ. Πρωτ.: 2048

Προς: **Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ**
info@dv-architects.gr

ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ
info@liontos.gr

Κοιν.: Πρόεδρο του ΑΣΔΑ
Ανδρέα Π. Παχατουρίδη

Διαμαντόπουλος Μόσχος (Γ.Δ.)

Παράδοση: Με email

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση υποβολής παρατηρήσεων επί της αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και της κατασκευής κλίμακας του έργου: "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ"

Σας διαβιβάζουμε το υπ' αρ. 2045/24.05.2024 έγγραφο του αναδόχου του έργου "Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", με το οποίο ο ανάδοχος υποβάλει παρατηρήσεις επί της αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και την κατασκευή της κλίμακας προς την οδό Διγ. Ακρίτα και παρακαλούμε για τις απόψεις σας και την ταχύτερη δυνατή ανταπόκρισή σας.

Η Προϊσταμένη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Μαρία Κάγκα

Εσωτερική Διανομή:

::Κάγκα Μαρία (Τ.Μ.Ε.)

Συνημμένο Αρχείο	
34285-HMA-3-APOXET_PER_XWROY_signed.pdf	Επισκόπηση
34285-PARATHRHSEIS-APOX-OMVRIWN.pdf	Επισκόπηση
34285-YPOVOLH-PARATHRHSEWN-OMVRIWN.pdf	Επισκόπηση



ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Έργο: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Θέμα: Παρατηρήσεις επί της μελέτης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων του έργου και της κατασκευής της κλίμακας προς την οδό Διγενή Ακρίτα.

Με το παρόν έγγραφό μας θέλομε να σας ενημερώσουμε σχετικά με δύο βασικά προβλήματα που έχουν προκύψει και αφορούν κατά πρώτον στην μελέτη αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων του περιβάλλοντα χώρου του έργου προς την οδό Διγενή Ακρίτα και κατά δεύτερον στην κατασκευή της κλίμακας που ενώνει τον ανωτέρω περιβάλλοντα χώρο με την εν λόγω οδό.

Σύμφωνα με το τεύχος υπολογισμών της αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και τα αντίστοιχα σχέδια έχομε να παρατηρήσουμε τα εξής:

- 1) Όσον αφορά στην απορροή των ομβρίων υδάτων του δώματος του κτιρίου του καμινιού επιφάνειας περίπου 700μ² απαιτούνται 4 υδρορρόες DN 125 που κάθε μια καλύπτει βρεχόμενη επιφάνεια 185μ² (βλ. τεύχος υπολογισμών αποχέτευσης σελ. 16 & σχέδιο ΗΜ Α-3). Οι εν λόγω υδρορρόες καταλήγουν σε ανοικτό (με σχάρα) κανάλι περιμετρικά του κτιρίου και στη συνέχεια το κανάλι αποχετεύεται με δύο σωλήνες DN 125 μέσω των φρεατίων Φ6-Φ7 και Φ2-Φ3-Φ4-Φ5 στο μεγάλο κανάλι-σχάρα στην αρχή της κλίμακας που οδηγεί στην οδό Διγενή Ακρίτα (βλ. σχέδιο ΗΜ Α-3). Είναι φανερό ότι οι δύο αγωγοί DN 125 δεν μπορούν να παραλάβουν ολόκληρη την ποσότητα υδάτων που διοχετεύουν οι τέσσερις αγωγοί του δώματος στο ανωτέρω περιμετρικό κανάλι.
- 2) Η βρεχόμενη επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου γύρω από το κτίριο του καμινιού είναι περίπου 1.500μ² (βλέπε συνημμένο σχέδιο) και αποχετεύεται επίσης στο ίδιο κανάλι-σχάρα στην αρχή της εν λόγω κλίμακας. Τέλος το κανάλι-σχάρα, παραλαμβάνοντας την συνολική ποσότητα των ομβρίων υδάτων που απορρέει από

την επιφάνεια των 2.200μ² (700μ²+1.500μ²), αποχετεύεται με δύο αγωγούς DN 125 οι οποίοι κατά τμήματα είναι ανοικτοί αγωγοί ανάλογης διατομής, οδεύοντας κατά μήκος της κλίμακας έως το ρείθρο της οδού Διγενή Ακρίτα.

Αναλογικά για την απορροή των ομβρίων υδάτων της ανωτέρω επιφάνειας του περιβάλλοντα χώρου γύρω από το καμίνι απαιτούνται 1.500/185=8,10 δηλαδή 8 τουλάχιστον σωλήνες DN 125.

Αθροιστικά (2.200μ²) για την απορροή των ομβρίων υδάτων των ανωτέρω επιφανειών μέσω του καναλιού-σχάρας προς την οδό Διγενή Ακρίτα απαιτούνται 12 σωλήνες DN 125 αντί 2 σωλήνων DN 125 που προβλέπει η μελέτη του έργου.

Από τα παραπάνω αναφερόμενα γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του περιβάλλοντα χώρου γύρω από το κτίριο του καμινιού και πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα για την συνέχιση των εργασιών διαμόρφωσης αυτού και ολοκλήρωση του έργου.


Όσον αφορά στην κατασκευή της ανωτέρω κλίμακας που οδηγεί στην οδό Διγενή Ακρίτα και φαίνεται στο «Σχέδιο Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου Κ1», σας ενημερώνουμε ότι δεν μπορεί να κατασκευασθεί αφού στην αρχιτεκτονική μελέτη δεν υπάρχουν σχέδια λεπτομερειών και στην στατική μελέτη δεν γίνεται καμία αναφορά.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με Τιμή,
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

Γεώργιος Χ. Καπερώνης
Πολιτικός Μηχανικός

**ΚΟΚΚΙΝΗΣ**
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 4 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ.15231 - Τ.:210-6745906
ΑΦΜ: 094319985 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: info@stathiskokkinis.com

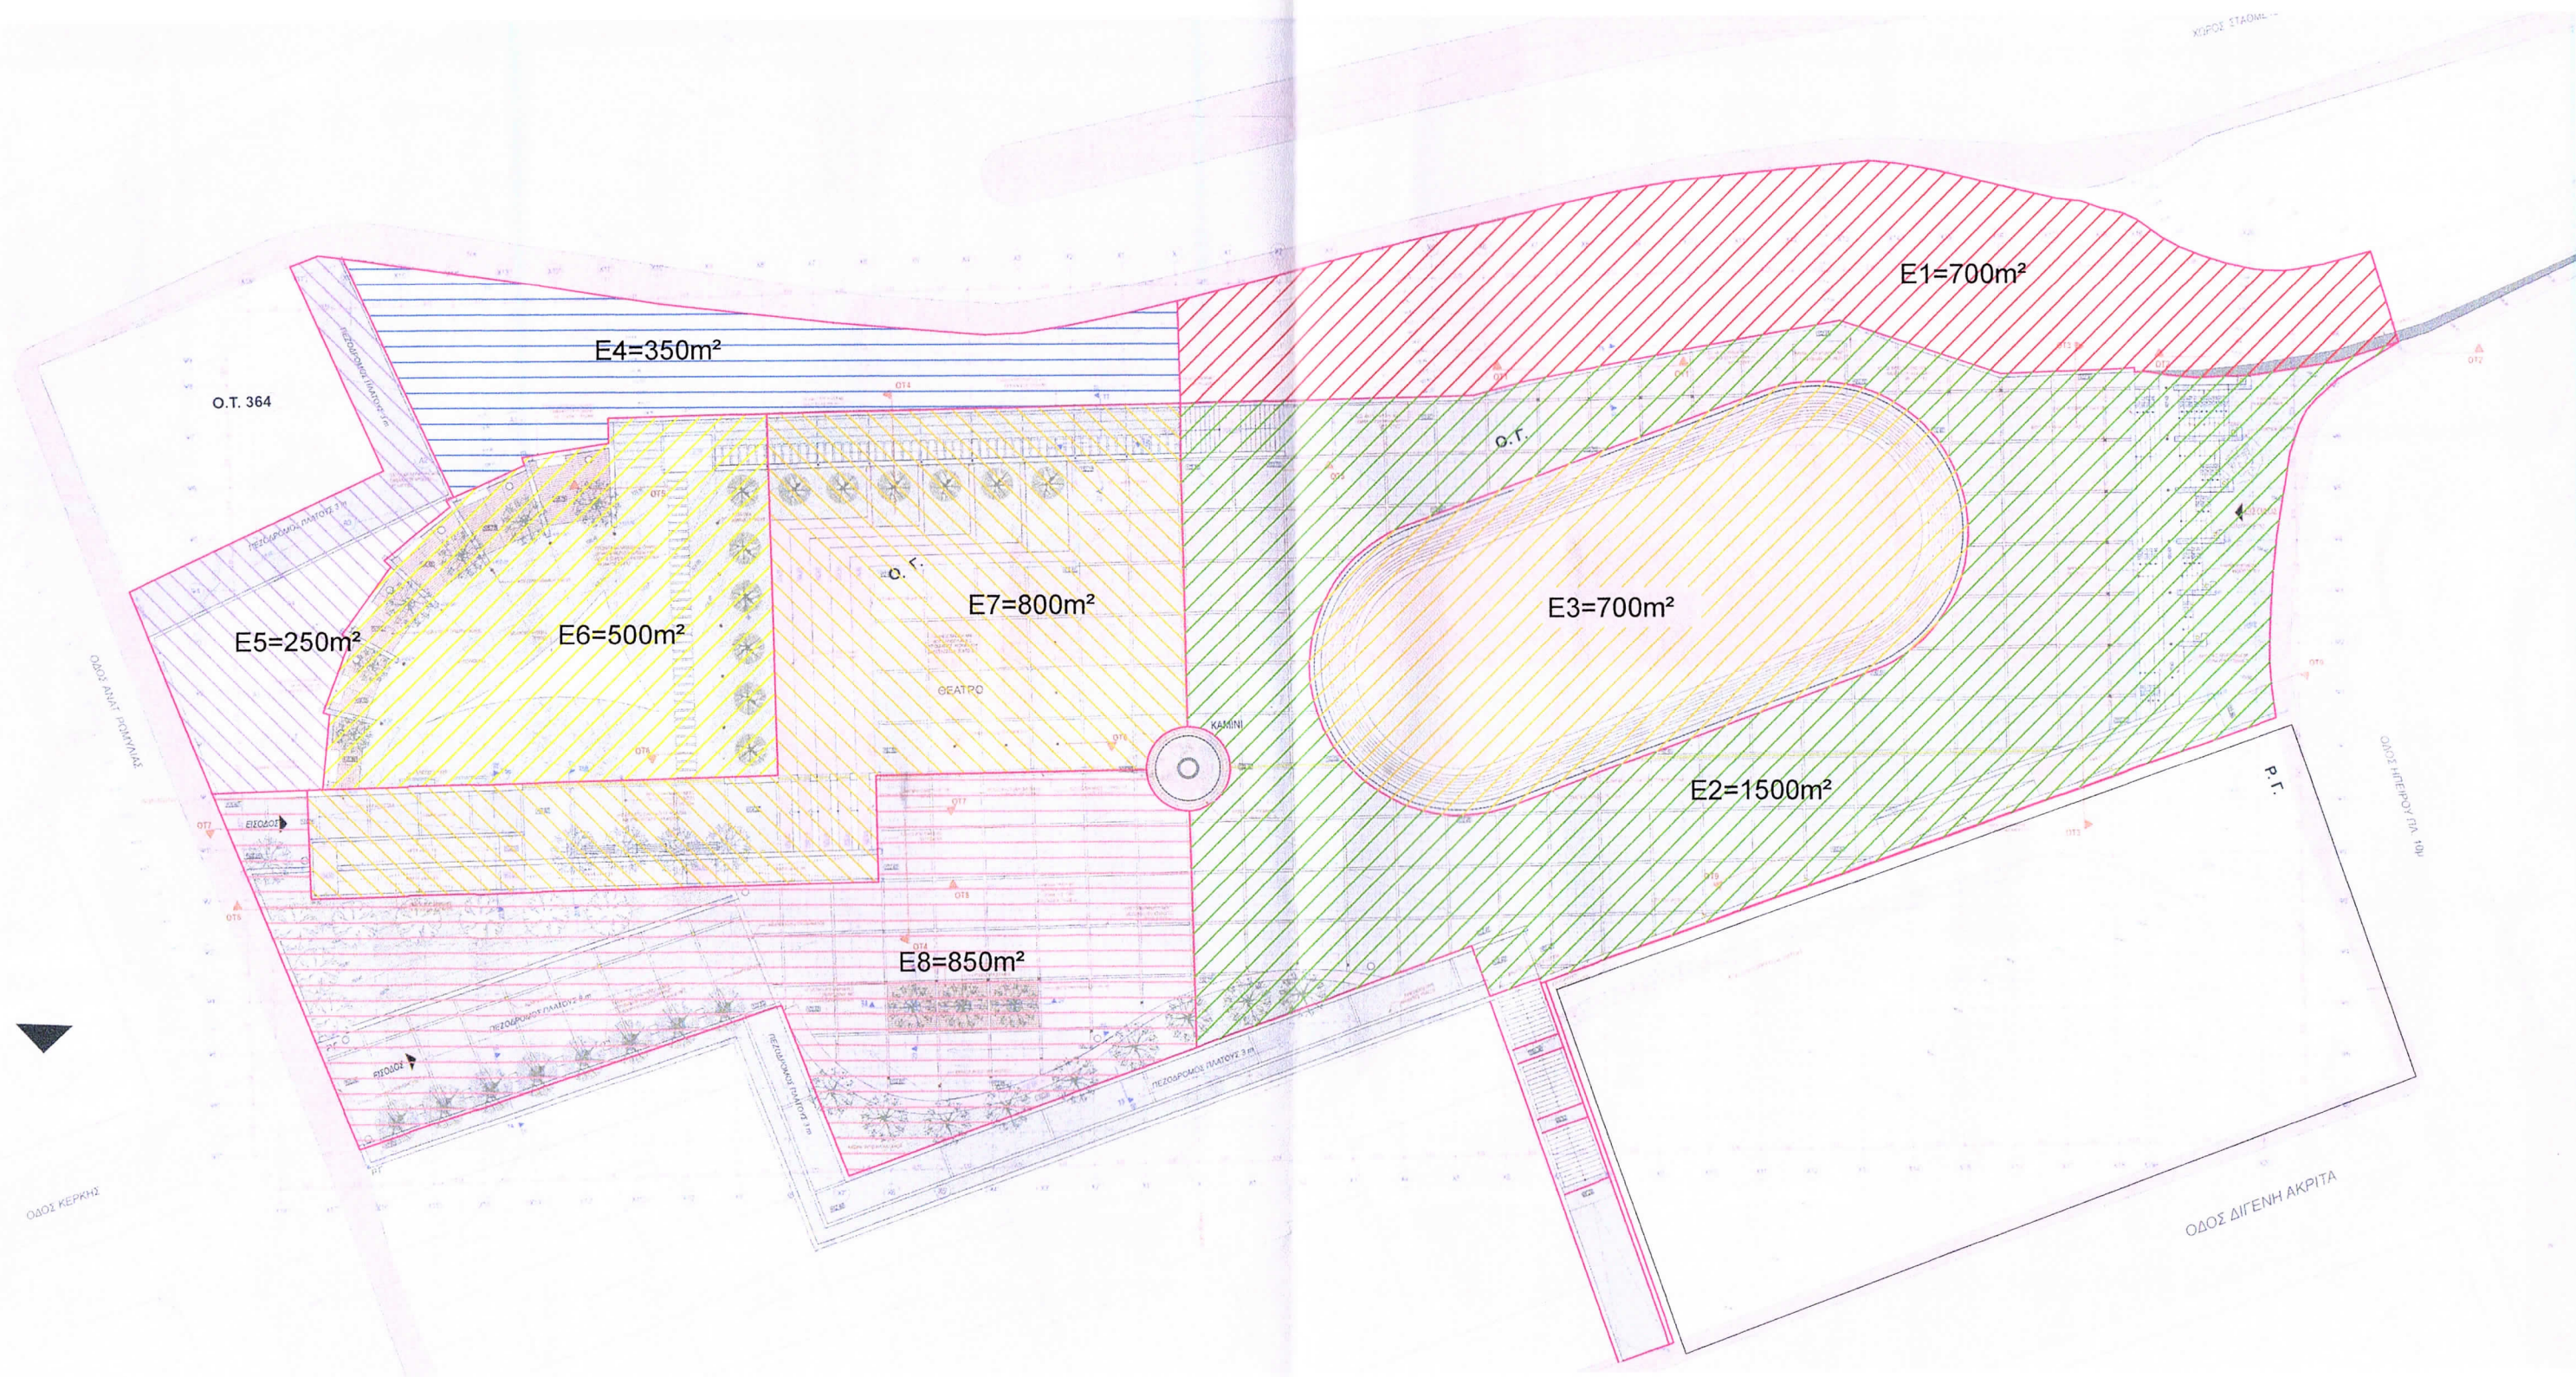



ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Αχιλλέως 4 - Χαλάνδρι - Τ.Κ.: 15231
Τηλ.Κέντ.: 210.6745906 FAX: 210.6725410



<https://ktsa.gr>



info@ktsa.gr

Ανάδοχος του έργου:
«Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης
Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης & Ανάπλαση
Περιβάλλοντος Χώρου»

Χαλάνδρι, 24/05/2024

ΠΡΟΣ: Α.Σ.Δ.Α.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: « Υποβολή Παρατηρήσεων επί της αποχέτευσης ομβρίων υδάτων του έργου και της κατασκευής της κλίμακας προς την οδό Διγενή Ακρίτα»

Σας υποβάλουμε τις παρατηρήσεις μας επί της μελέτης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων του έργου και της κατασκευής της κλίμακας προς την οδό Διγενή Ακρίτα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με Τιμή,
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Χ. Καπερώνης
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 4 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ.15231 - Τ.:210-6745906
ΑΦΜ: 094319985 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: info@stathiskokkinis.com

Συνημμένα:
Σχέδιο Αποχέτευσης ομβρίων υδάτων



ΕΛΟΤ EN
ISO 9001:2015



ΕΛΟΤ EN
ISO 14001:2015



ΕΛΟΤ EN
ISO 45001:2018



ΕΛΟΤ EN
ISO 14001:2015



ISO 22301:2012
